ROCCIA
CONSTRUÇÕES

Edifício Park Dumont

Informações sobre o andamento da Obra

OUTUBRO / 2020

Conteúdo

1) Informações Gerais;
2) Cronograma Físico
3) Acompanhamento Serviços Internos;
4) Fotos Atuais.

1) Informações Gerais da Obra

ESTÁGIO DA OBRA	
Nome do Empreendimento:	Edf. PARK DUMONT
Início da obra:	Janeiro/2017
Término da obra:	Maio/2021
% Executado da obra: Físico	72,72 %
Efetivo Obra	42 funcionários
Fase Atual da Obra:	5, 6, 7 e 8

Legenda: **1 –** Área de vivência; **2 –** Fundação; **3 –** Estrutura; **4 –** Alvenaria; **5 –** Instalações; **6 –** Revestimento Interno; **7 –** Fachada ; **8 –** Acabamento **; 9 –** Limpeza **; 10 –** Entrega de obra.

2) Cronograma Físico

PARK DUMONT - OUTUBRO 2020	
100,00%	FUNDAÇÃO
100,00%	ESTRUTURA
98,21%	ALVENARIA
57,01%	INSTALAÇÕES
54,42%	REVESTIMENTO INTERNO
61,16%	FACHADA
7,41%	ACABAMENTOS
72,72%	AVANÇO FÍSICO DA OBRA

3) Acompanhamento Serviços Internos

ROCCIA CONSTRUÇÕES

OBRA:	PARK DUMONT	OUTUBRO 2020

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS - CONCLUÍDOS

ATIVIDADES	1º PAV	2º PAV	3º PAV	4º PAV	5º PAV	6º PAV	7º PAV	8º PAV	9º PAV	10º PAV	11º PAV	12º PAV	13º PAV	14º PAV	15º PAV	16º PAV	17º PAV	18º PAV
CONTRAPISO A.SECA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONTRAPISO A.MOLH.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALVENARIA BL. GESSO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONTRAMARCOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAIXAS ELÉTRICAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TUBULAÇÃO DE TETO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COLUNAS HIDRÁ.PLUV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PEX ÁGUA FRIA/QUEN*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPERMEAB. BWC´S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REVEST.GESSO BWC´S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REVEST. GESSO A.SEC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INFRA. INST. GÁS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DRENOS SPLIT´S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CERÂMICA APT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CERÂMICA HALL	X																	
FIAÇÃO APT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KIT SPLIT´S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COLUNAS INCÊNDIO																		
ESQUEMA VERT. ELÉT																		
BALCÕES GRANITO	X	X	X															
PINTURA ÁREA COMUM																		
DISJUNTORES																		
ACABAM. ELÉTRICOS																		
EXTINTORES A.COMUM																		
ESQUA. ALUMÍNIO																		
PORTAS	X	X	X															
LOUÇAS / METAIS	x	x	x															

4) Fotos Atuais da Obra

ROCCIA
CONSTRUÇÕES

REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE

4) Fotos Atuais da Obra

ROCCIA
CONSTRUÇÕES

FORRO DE GESSO

4) Fotos Atuais da Obra

ROCCIA
CONSTRUÇÕES

REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO

4) Fotos Atuais da Obra

ROCCIA
CONSTRUÇÕES
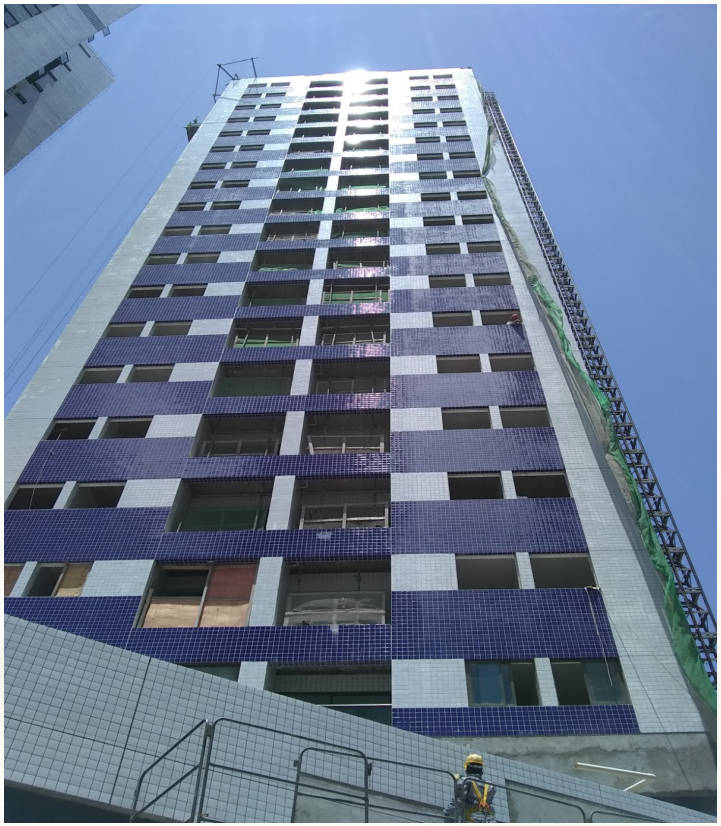
FACHADA FRONTAL (LESTE)
